

IUC#23

Aug. 12, 2005

- (1) 工事報告(佐藤)
- (2) その他

IUC工事報告

IUC#23


Aug. 12, 2005


M. Satoh

全体工程・予定


- 冷却水配管完了
- BPM, Screen設置 (ほぼ完了・PF SCアライメント完了)
- パワーケーブル敷設・繋ぎ込み
- 電磁石極性チェック完了 (ベンド冷却水インタロックOK)
- モニタ・GV信号線敷設 (繋ぎ込み未・来週)
- SCモニタ・GV用エアー配管終了 (繋ぎ込み・順次)
- 共通架台上のコンポーネント設置 (本日完了)
- KEKB \leftrightarrow Linac間安全系ケーブル敷設
(メタル20P, ファイバ)
- 真空ダクト設置 (QPD1まで完了) => 来週真空引き

BKから下流方向

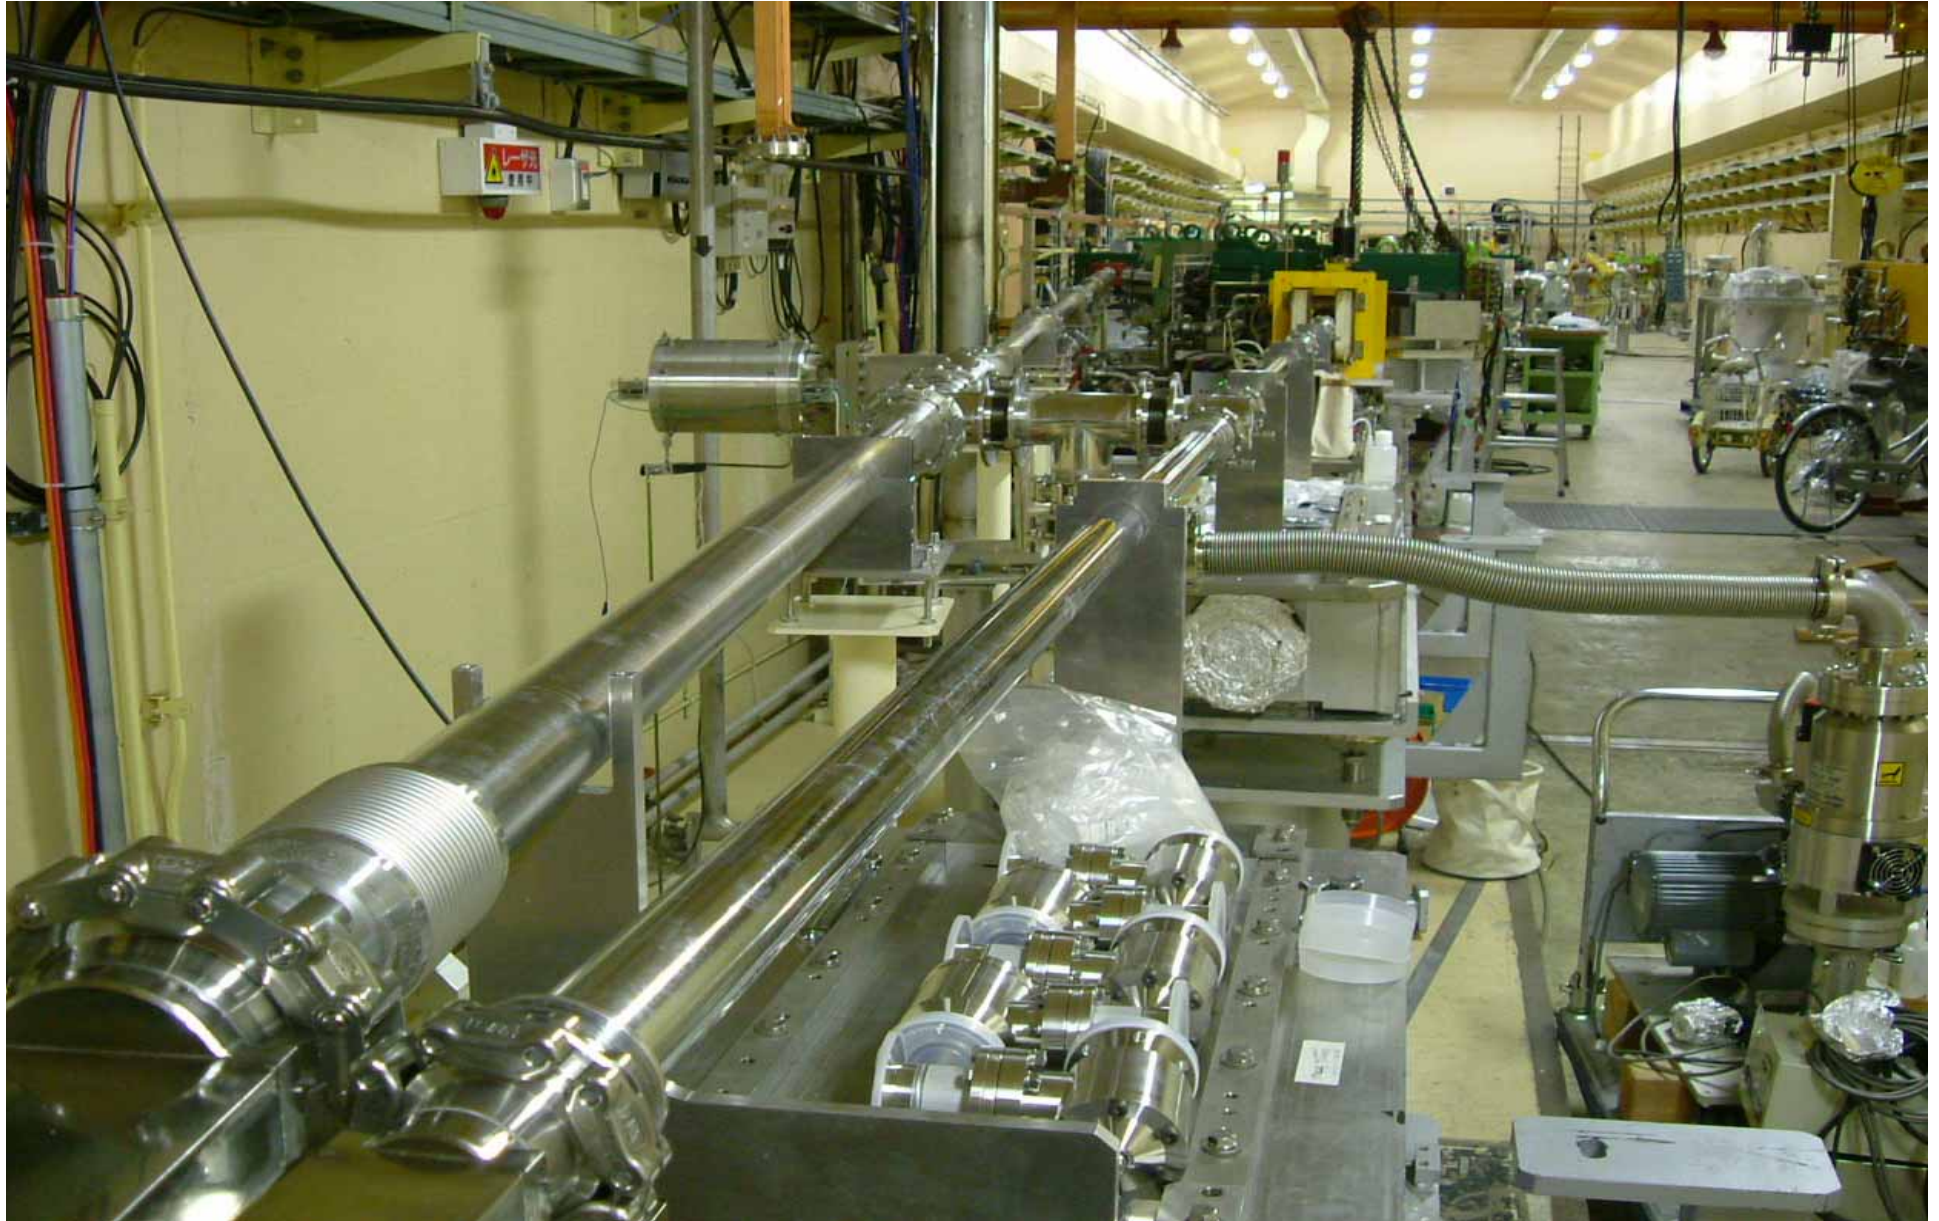

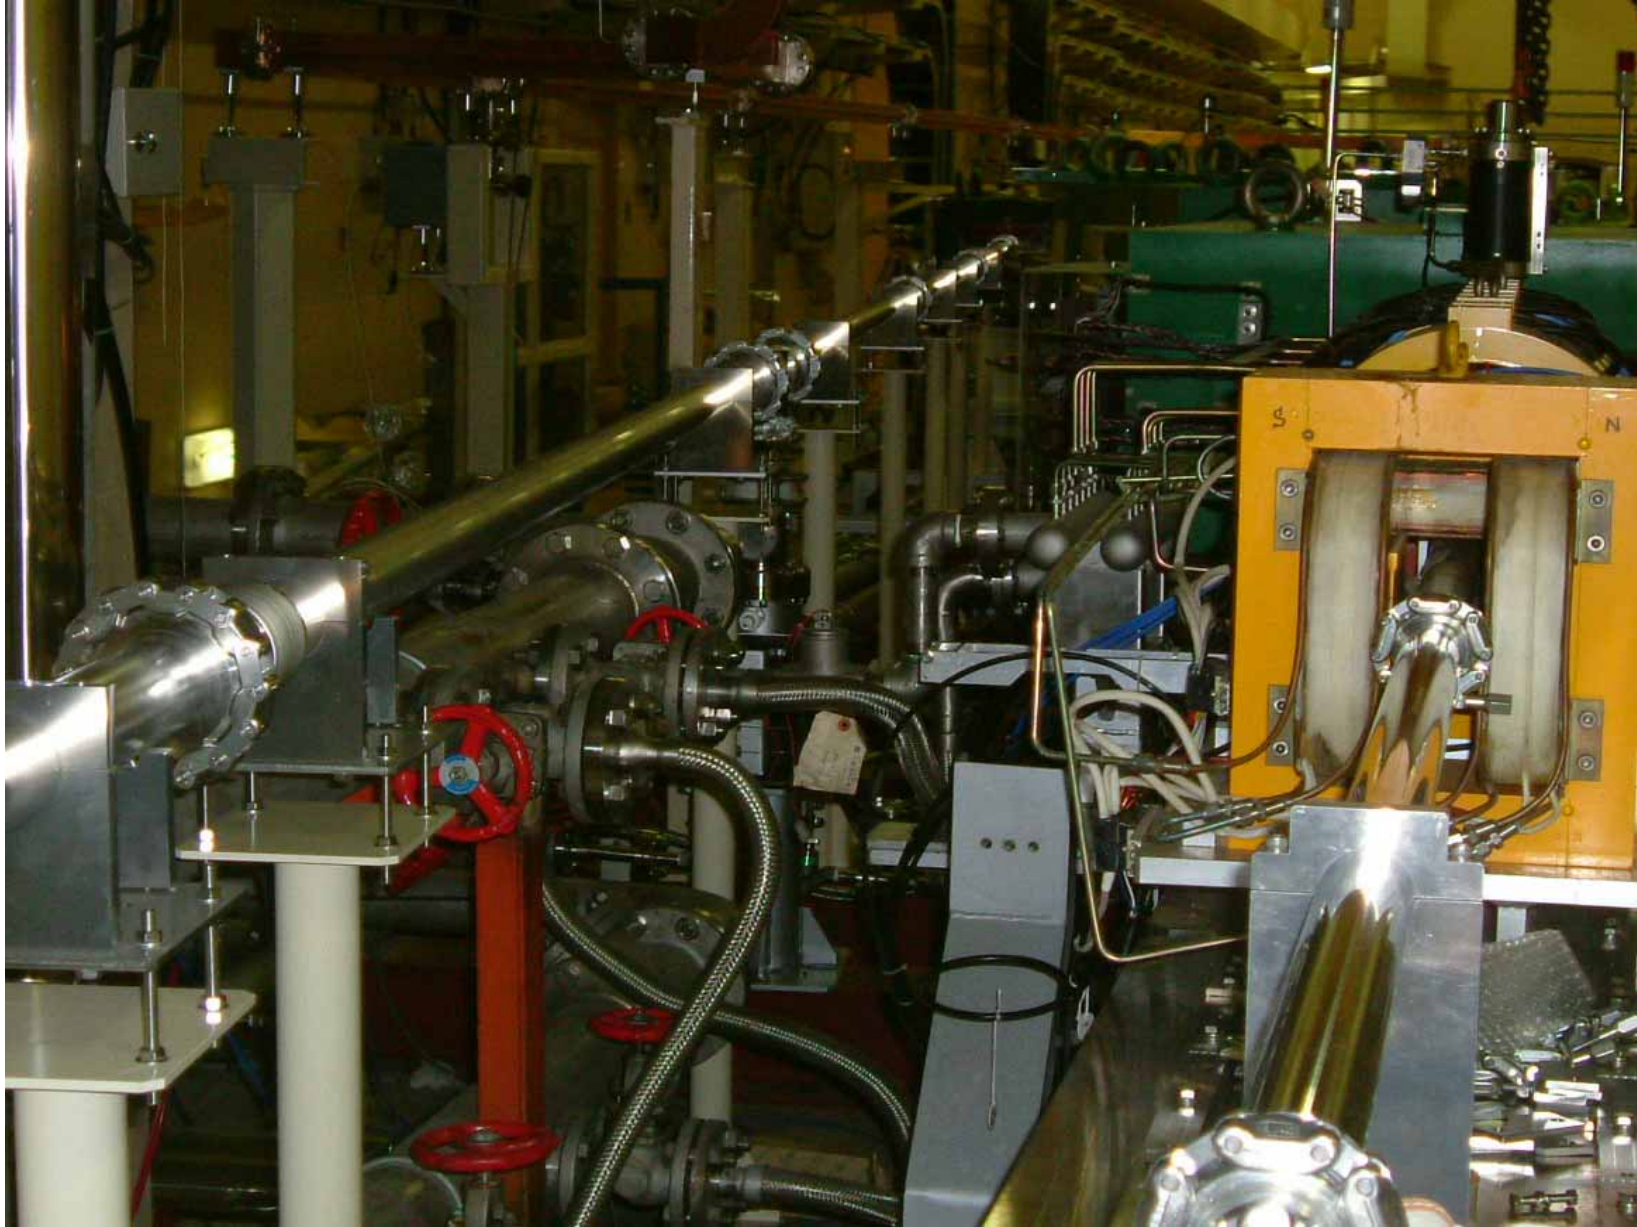


共通架台

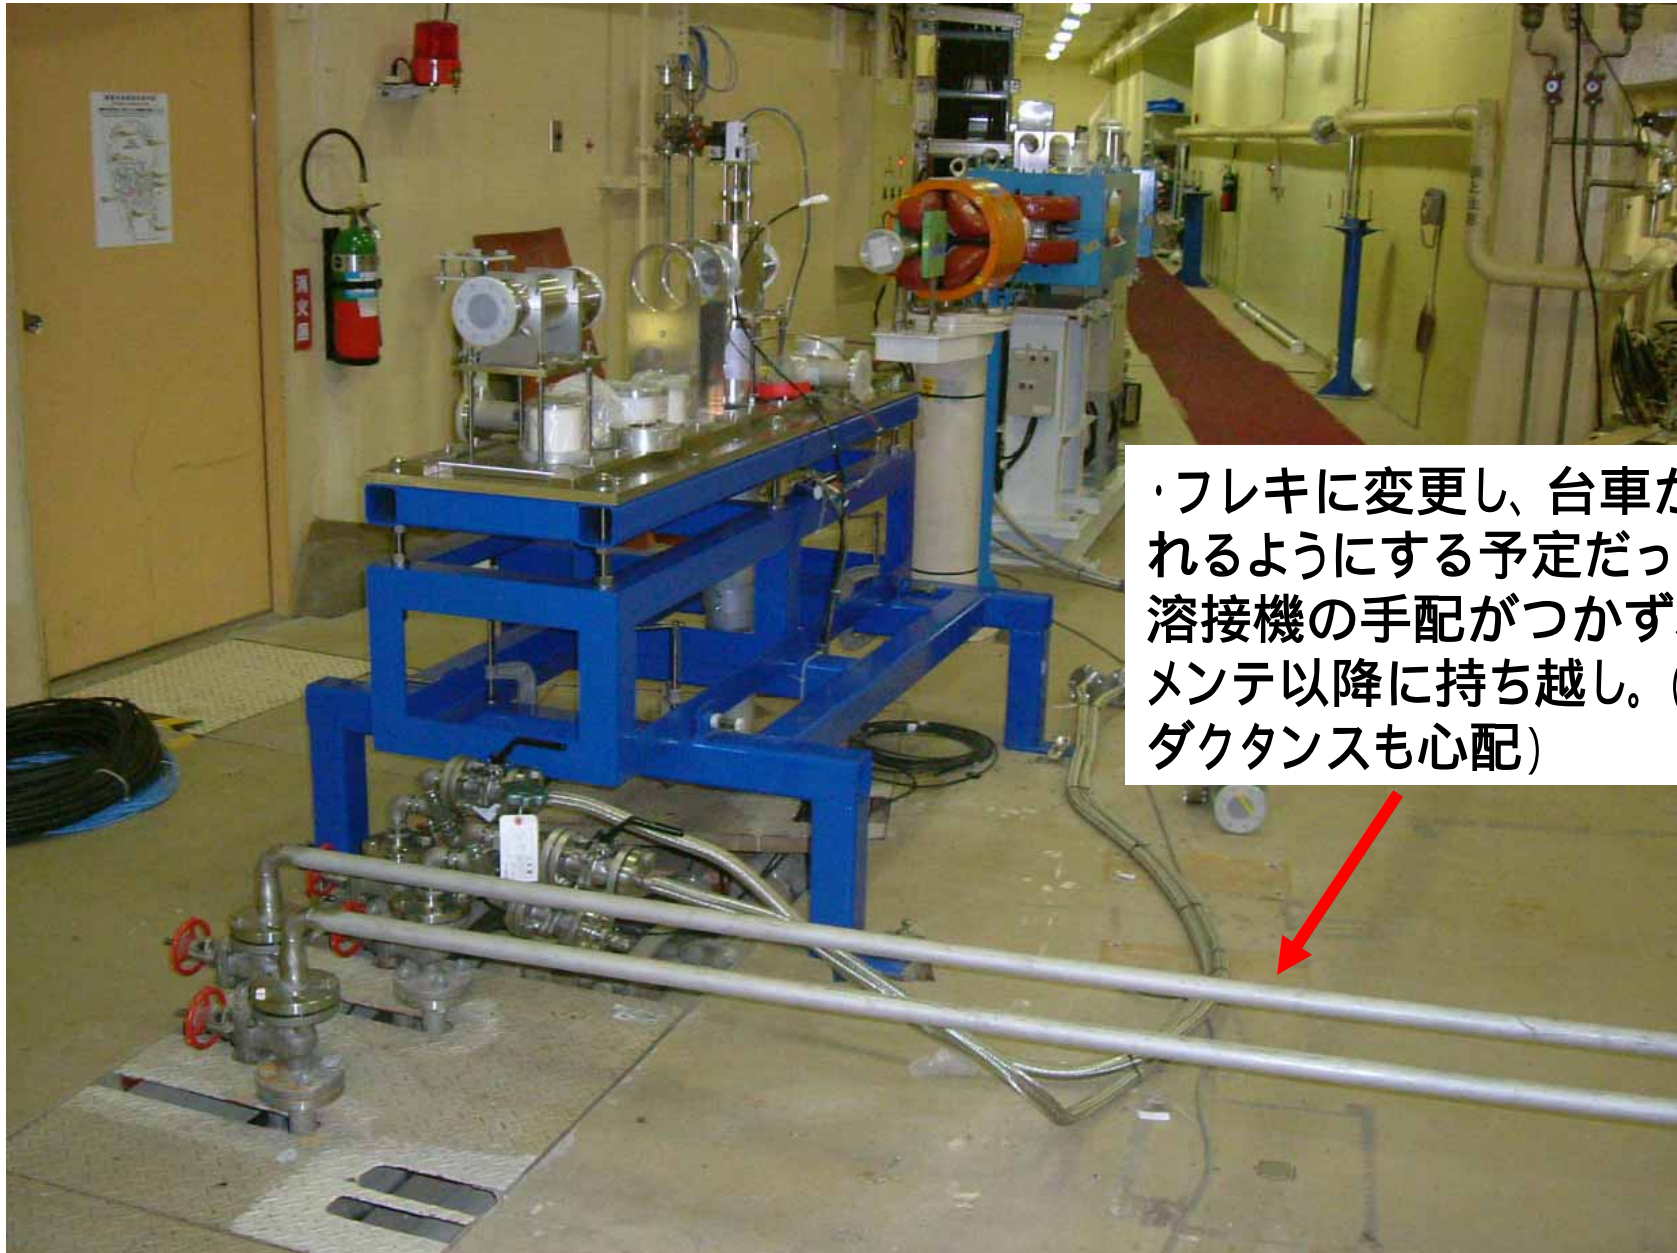


・フレキに変更し、台車が通れるようにする予定だったが、溶接機の手配がつかず、冬メンテ以降に持ち越し。(コンダクタンスも心配)

KEKB ⇔ Linac 安全系ケーブル敷設

・3-4セクタの間からLinac
ギャラリーケーブルラックで
引き回し、制御室地下の端
子台へ接続。

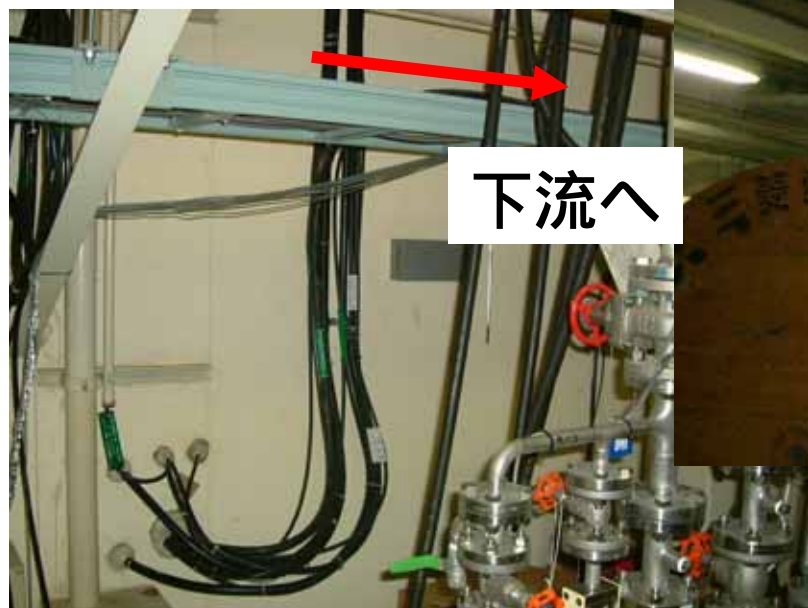

下流へ

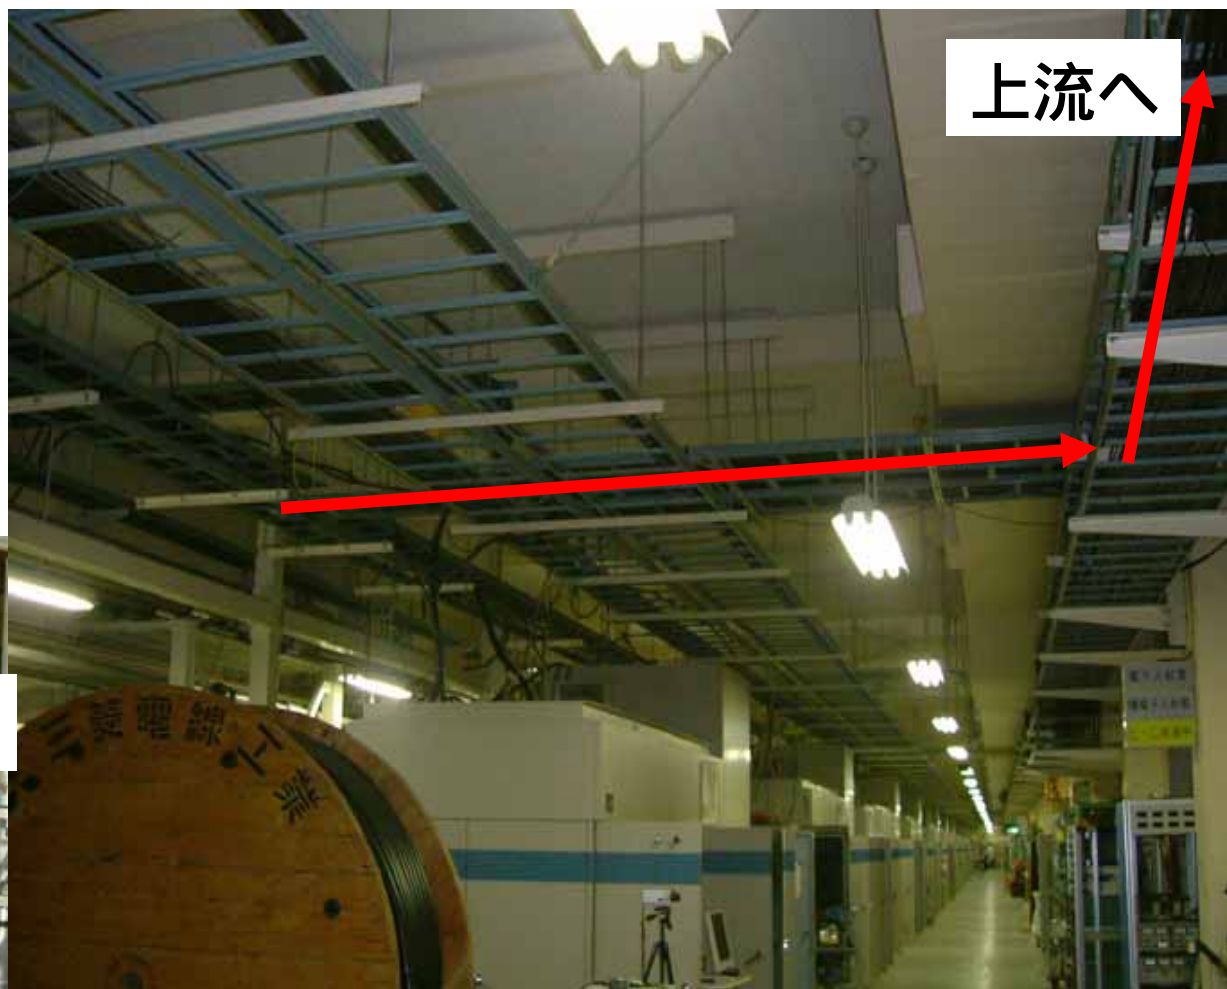

上流へ

停電のお知らせ

- 入射器地区停電に伴いまして、
8月20日(土) 8:30 ~ 18:00
8月21日(日) 8:30 ~ 18:00

入射器ゲートシステムが停止します。

8月19日(金) 17:00 ~ 22日(月) 9:00

(*) 不都合のある方はご相談下さい。

B* ... Bending magnet
QP* ... Q-magnet
HP* ... Horizontal steering magnet
VP* ... Vertical steering magnet

